



臺北醫學大學醫學綜合大樓


興建工程 進 | 度 | 報 | 告

文 / 工作小組

時序進入秋天，北醫校園內也染上楓香的紅彩，與此同時，大家期待已久的醫學綜合大樓，也雄偉矗立在校園內，與我們同樣興奮地迎接這絢爛的初秋。

本大樓為了能兼顧使用者的便利與空間的充分利用，依其功能導向的不同而有所區分。原則上低樓層規劃為學生活動區及教學區，高樓層則規劃為研究實驗區，簡述如下：本大樓的地下二、三樓為停車空間、地下一、二樓及地上一樓為教學區（視聽教室及一般教室）與學生活動區、地上二至四樓為行政單位、圖書館與資服中心、五、六樓為全校共同實驗室、七至十二樓為醫學院（醫學系、所）、十三、十四樓則為護理學院、十

五、十六樓則為會議區。醫學綜合大樓興建工程目前進度截至 92 年 9 月 15 日止，施工天數 1286 天、剩餘天數 15 天，預定進度 95.77 %、現場施工進度 98.85 %，落後進度 3.07 %（約為 40 天），施工項目如後：

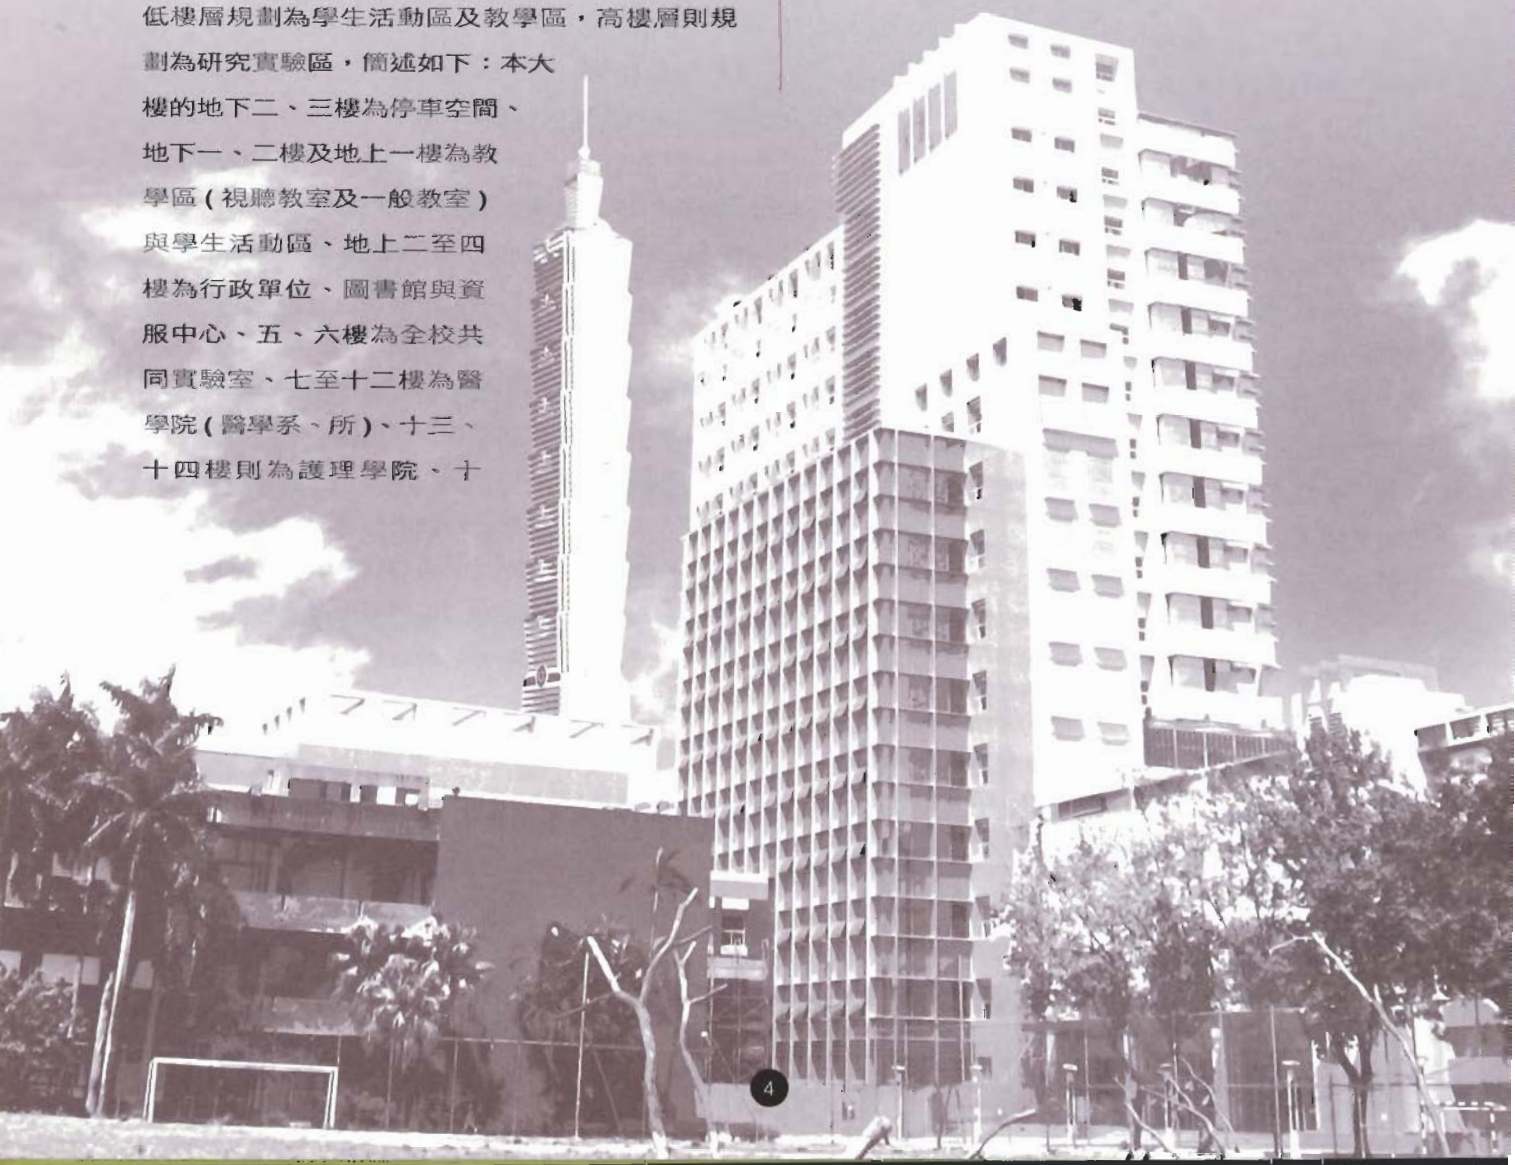

(一)主體工程部份

1. 主棟背面出入口及鐘塔外牆粉刷及貼磁磚。
2. 地下三樓回填區止漏。
3. 川堂外牆面貼石材。
4. 廣場迴廊粉刷。
5. 前棟鋁企口天花施作。
6. 主棟排煙室及廁所地坪貼磁磚。
7. 入口空間桁架吊裝。
8. 景觀廣場及路面施作。
9. 輕隔間放樣及施作。
10. 消音箱進場及安裝。
11. 4F 以下樓層火警感知器配管。
12. 空調系統管路配管。
13. 川堂企口天花板施作。
14. C 棟屋頂泡沫混凝土施作。
15. 戶外音樂廳地坪粉刷。
16. 杏春樓前景觀及路面施作。
17. 教學大樓側排水溝施作。
18. 建照二次變更設計已在 9/8 由建築師送建管處掛件，持續辦理後續作業中。



本校原有操場暨戶外體育運動空間共有 12559 平方公尺 (3800 坪)，計有 紅土網球場一座、PU 網球場二座、網球練習牆兩面、高爾夫球練習場一座、排球場三座、籃球場三座、操場一座可供壘球、足球、橄欖球運動或競技使用。敦為提昇體育運動風氣及彌補戶外易受天氣風雨影響之不足，特興建體育館一座，並於 91 年 11 月 18 日開始使用，提供更進一步之硬體設施服務。綜合體育館內

含主項有溫水游泳池、SPA、韻律教室及綜合球場 (可兼做集合場地)。體育館功能簡介如下：

新建體育館樓高 14.7 公尺，為地下一層、地上三層之建物，樓地板面積共有 3671.97 平方公尺 (1110.77 坪)。一樓面積為 514.53 平方公尺 (155.64 坪)，除入口門廳外，體育室及體育器

材室也位於此。地下一樓面積為 1462.99 平方公尺 (442.55 坪)，設置有溫水游泳池、SPA 水療池、三溫暖烤箱及蒸氣室、男女更衣室、韻律教室等。韻律教室約 40 坪、配備 DVD 組合音響及 34 吋電視等，可供有氧運動、舞蹈教學等使用。溫水游泳池為 25 公尺長、六水道、深度 1.2 米至 1.4 米之溫水游泳池，可容納一班 60 人游泳教學使用。本池設有平衡水箱及版式熱交換器，並設有溢水回收系統收集泳池排放水，結合醫學綜合大樓之雨水回收系統作為全棟衛生設備沖洗用水。SPA 水療池設有立體寬牆瀑布、大型強波按摩噴頭、氣泡座、頭部按摩沖擊泉、臀腿按摩噴頭、背部按摩噴頭、頸部按摩噴頭及休閒噴泉等。配合蒸氣室與檜木製作之三溫暖烤箱，以媲美五星級休閒中心的設備，提供全校師生一個綜合體育教學及恢復疲勞之舒適空間。二樓面積為 1061.17 平方公尺 (321 坪)，設置有室內球場、表演舞台及體育教師研究室。室內多功能球場位於體育館二樓，佔地約 236.51 坪。配置多功能使用之楓木地板球場一座、表演舞台並配備有燈光音響，以供舉辦大型活動使用。三樓面積為 559.63 平方公尺 (169.28 坪)，設置室內球場看臺，兩側看臺分別有七排座位，共可容納約 500 人觀賞各式活動。

(二)裝修工程部份

1. 輕隔間工程已於 7/15 前完成放樣及各層上、下槽鋼之組立架設，五至九樓中央走道之骨架 (含單面矽酸鈣板) 已於 7/31 完成，各樓層輕隔間工程持續施作中。
2. 機電消防及空調等二次側系統施工整合中，預計先完成五樓部份；機電、消防系統將於 9/15 前配合主體工程完成至使用執照請領；其餘弱電及空調系統之二次側部份，預計於 10/31 前完成四樓以下部份；12/31 完成五樓以上部份。
3. 完成試作樣品展示室二間，含個人研究室 (五樓) 及行政辦公室 (一樓總務長室)。
4. 裝修工程部份工項需配合主體工程辦理執照變更作業已於 7/15 完成，轉主體工程併案辦理，與主體工程之界面釐清作業已完成。
